OPLEVERRAPPORT

Nieuwbouw Zorgcentrum De Linde

RAP-0416

2 november 2026

Concept

PROJECT
PRJ-2318

OPDRACHTGEVER
Bouwcombinatie Noordwest (fictief)

LOCATIE
Lindelaan 40, Veldstad


MONTEUR
Lotte Hendriks

FASE
Oplevering

Samenvatting

6 ruimtes ingeregeld. 2 ruimtes wijken meer dan de toegestane tolerantie af van het ontwerp: 2.14 Vergaderruimte, 2.20 Pantry. Deze staan als restpunt in het rapport.

Tekening

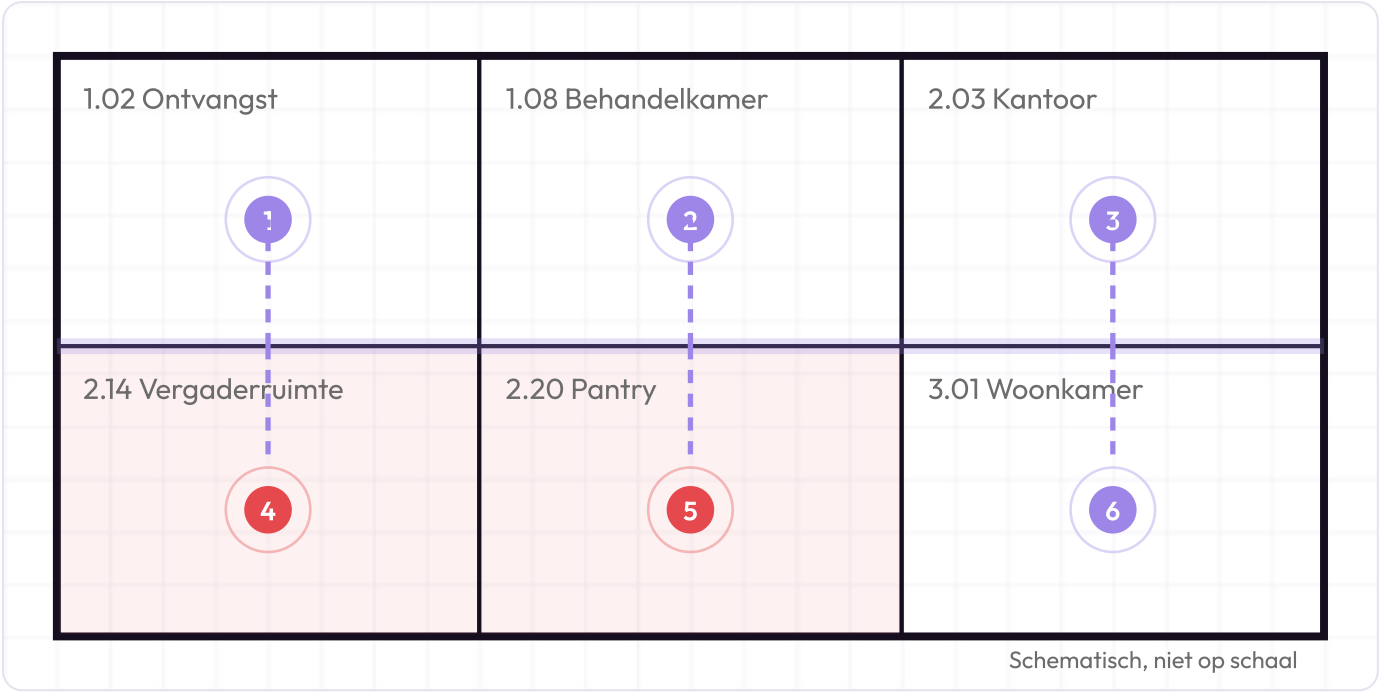

Schematisch, niet op schaal

Inregelmetingen

RUIMTE	ONTWERP	GEMETEN	AFWIJKING
1.02 Ontvangst	450 m³/h	462 m³/h	+2,7%
1.08 Behandelkamer	220 m³/h	214 m³/h	-2,7%
2.03 Kantoor	180 m³/h	187 m³/h	+3,9%
2.14 Vergaderruimte	**360 m³/h**	**291 m³/h**	**-19,2%**
2.20 Pantry	**120 m³/h**	**141 m³/h**	**+17,5%**
3.01 Woonkamer	300 m³/h	305 m³/h	+1,7%

Notities monteur

- Klimaatplafonds 2e verdieping volledig ingeregeld.
- Ruimte 2.14: inblaasrooster vervangen, wacht op nieuwe meting.
- Vloerverwarming begane grond gespoeld en ontlucht.

OPGESTELD DOOR
Lotte Hendriks

GECONTROLEERD DOOR
Nog niet gecontroleerd
